01 · Mapa de pantallas

Estructura existente · Las agrupaciones reproducen el menú actual; no son una propuesta de cambio.

A00 · PITOCUNA · Aplicación de tesis

Propuesta preliminar, sujeta a modificaciones y validación.

S00 · Selector superior · siempre visible

Mis datos: proyecto guardado. | Prueba vacía: sin registros. | Valores predeterminados: ejemplo ficticio.
La opción activa y los contadores se muestran arriba. Mis datos y prueba se guardan por separado.

RESUMEN

M01 · Resumen del proyecto

Pendientes y estado general.
Acceso a actividades y componentes.
Revisar ubicación y calendario.

C00 · Controles compartidos

Fecha de corte: limita la observación.
Componente: se conserva entre vistas.
Plan semanal e indicadores evalúan el corte completo, sin filtrar miembros.

C01 · Cómo pedir un cambio

Usa el código del bloque.
Ejemplo: «Mover M09C bajo M08».
Ese cambio aún NO está aplicado.

MENÚ · PREPARAR Y EJECUTAR

M02 · Actividades

Buscar y filtrar por componente.
Ficha: cronograma + Q/R + APU, planos, restricciones y compromisos.

M03 · Lookahead

Ventana de 3, 4, 6 u 8 semanas.
Revisar condiciones y restricciones.
Confirmar preparación cuando procede.

M04 · Restricciones

Problema, responsable y fecha necesaria.
Abierta / en revisión / liberada.
Evidencia y revisión para liberar.

M05 · Plan semanal

Actividad preparada + cantidad + criterio.
Borrador → congelar → evaluar.
Conserva los compromisos del corte.

M06 · Registro de avance

Cantidades diarias y evidencia.
Confirmación de entrega completa.
Interrupciones con fechas y causa.

M07 · Indicadores

PPC, PRL y continuidad.
Reporte CSV, fórmulas e historial.
Resultados a partir de registros.

MENÚ · EXPEDIENTE Y CONFIGURACIÓN

M08 · Visualización de obra

Un mismo espacio para consultar planos y flujo por componente.

M08A · Planos CAD

Visor, zoom y marcas documentales.
Partidas, APU y descarga DWG.

M08B · Flujo LBMS

Gráfico tiempo–ubicación.
Plan y pronóstico; puntos observados cuando existen.

M09 · Datos de obra

4 pestañas de importación y configuración.
Respaldo JSON y nuevo proyecto.

M09A · Cronograma

Excel / CSV / Project XML.

M09B · Metrados y R

Cantidad, unidad y rendimiento.

M09C · Ubicaciones LBS

Ubicación, grupo y orden.

M09D · Proyecto/calendario


Jornadas y feriados.

L00 · LBS ≠ LBMS

LBS organiza los lugares de trabajo. LBMS utiliza esas ubicaciones, cantidades y tiempos para representar el flujo. Los planos CAD son otra vista del expediente.

02 · Proceso de trabajo

Las flechas indican dependencias y decisiones. Una tarea importada no queda preparada automáticamente.

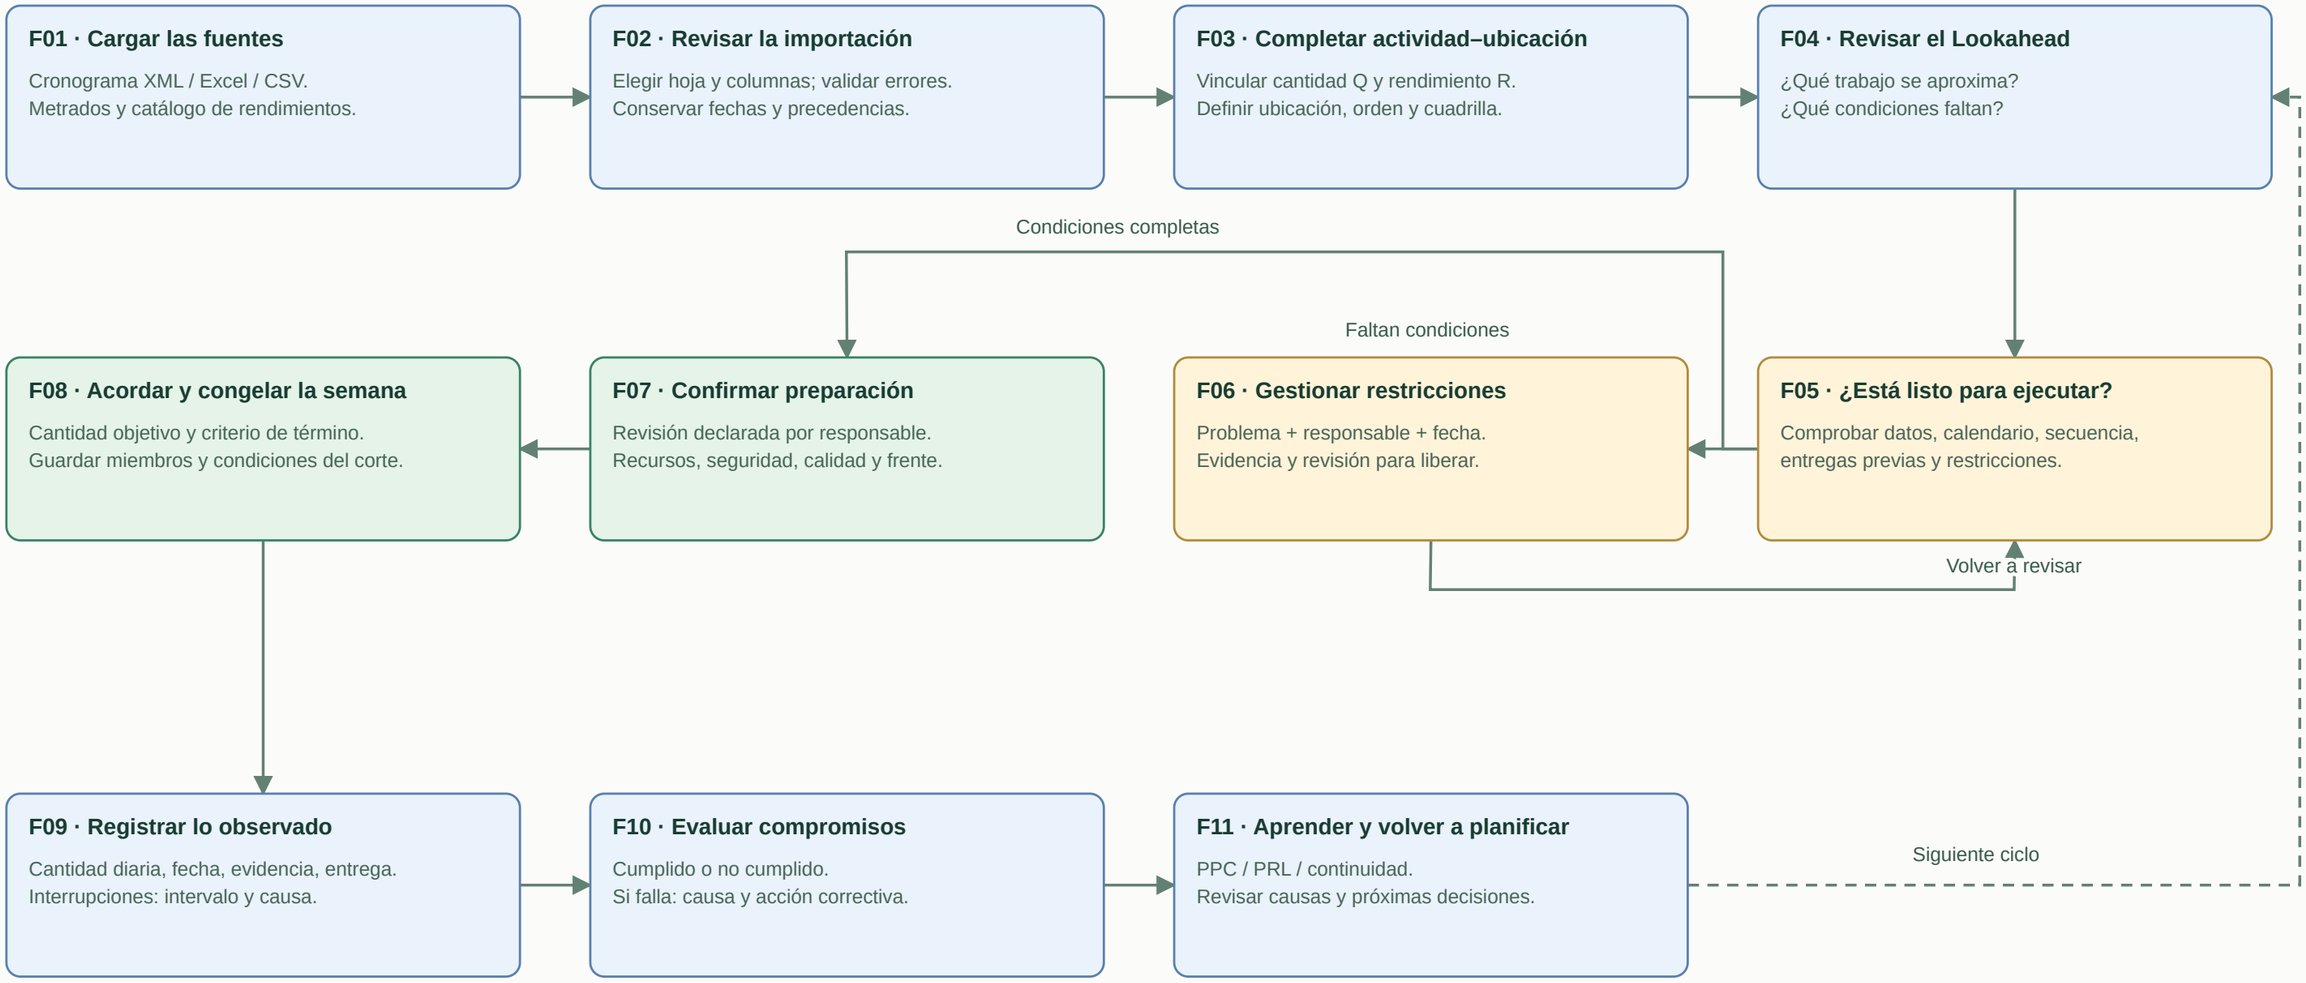

V01 · VISUALIZACIÓN DE APOYO · M08


Planos CAD: consultar documentos y partidas. | Flujo LBMS: consultar tiempo y ubicación.
Las vistas ayudan a revisar; no crean avance ejecutado ni liberan restricciones por sí solas.

R01 · Reglas que condicionan el proceso

- Una fecha estimada no libera una restricción: se exige evidencia, fecha real y revisión.
- La duración Q/R requiere unidades compatibles y metrado de la ubicación; un total agregado no define frentes.
- El compromiso exige preparación vigente. La semana se congela antes de iniciar; no se añaden miembros después.
- Los registros respetan el corte y el calendario. La falta de registros no demuestra avance físico igual a cero.

03 · Datos y cálculos

Arquitectura actual · Aplicación estática en navegador, con guardado local y respaldo exportable.

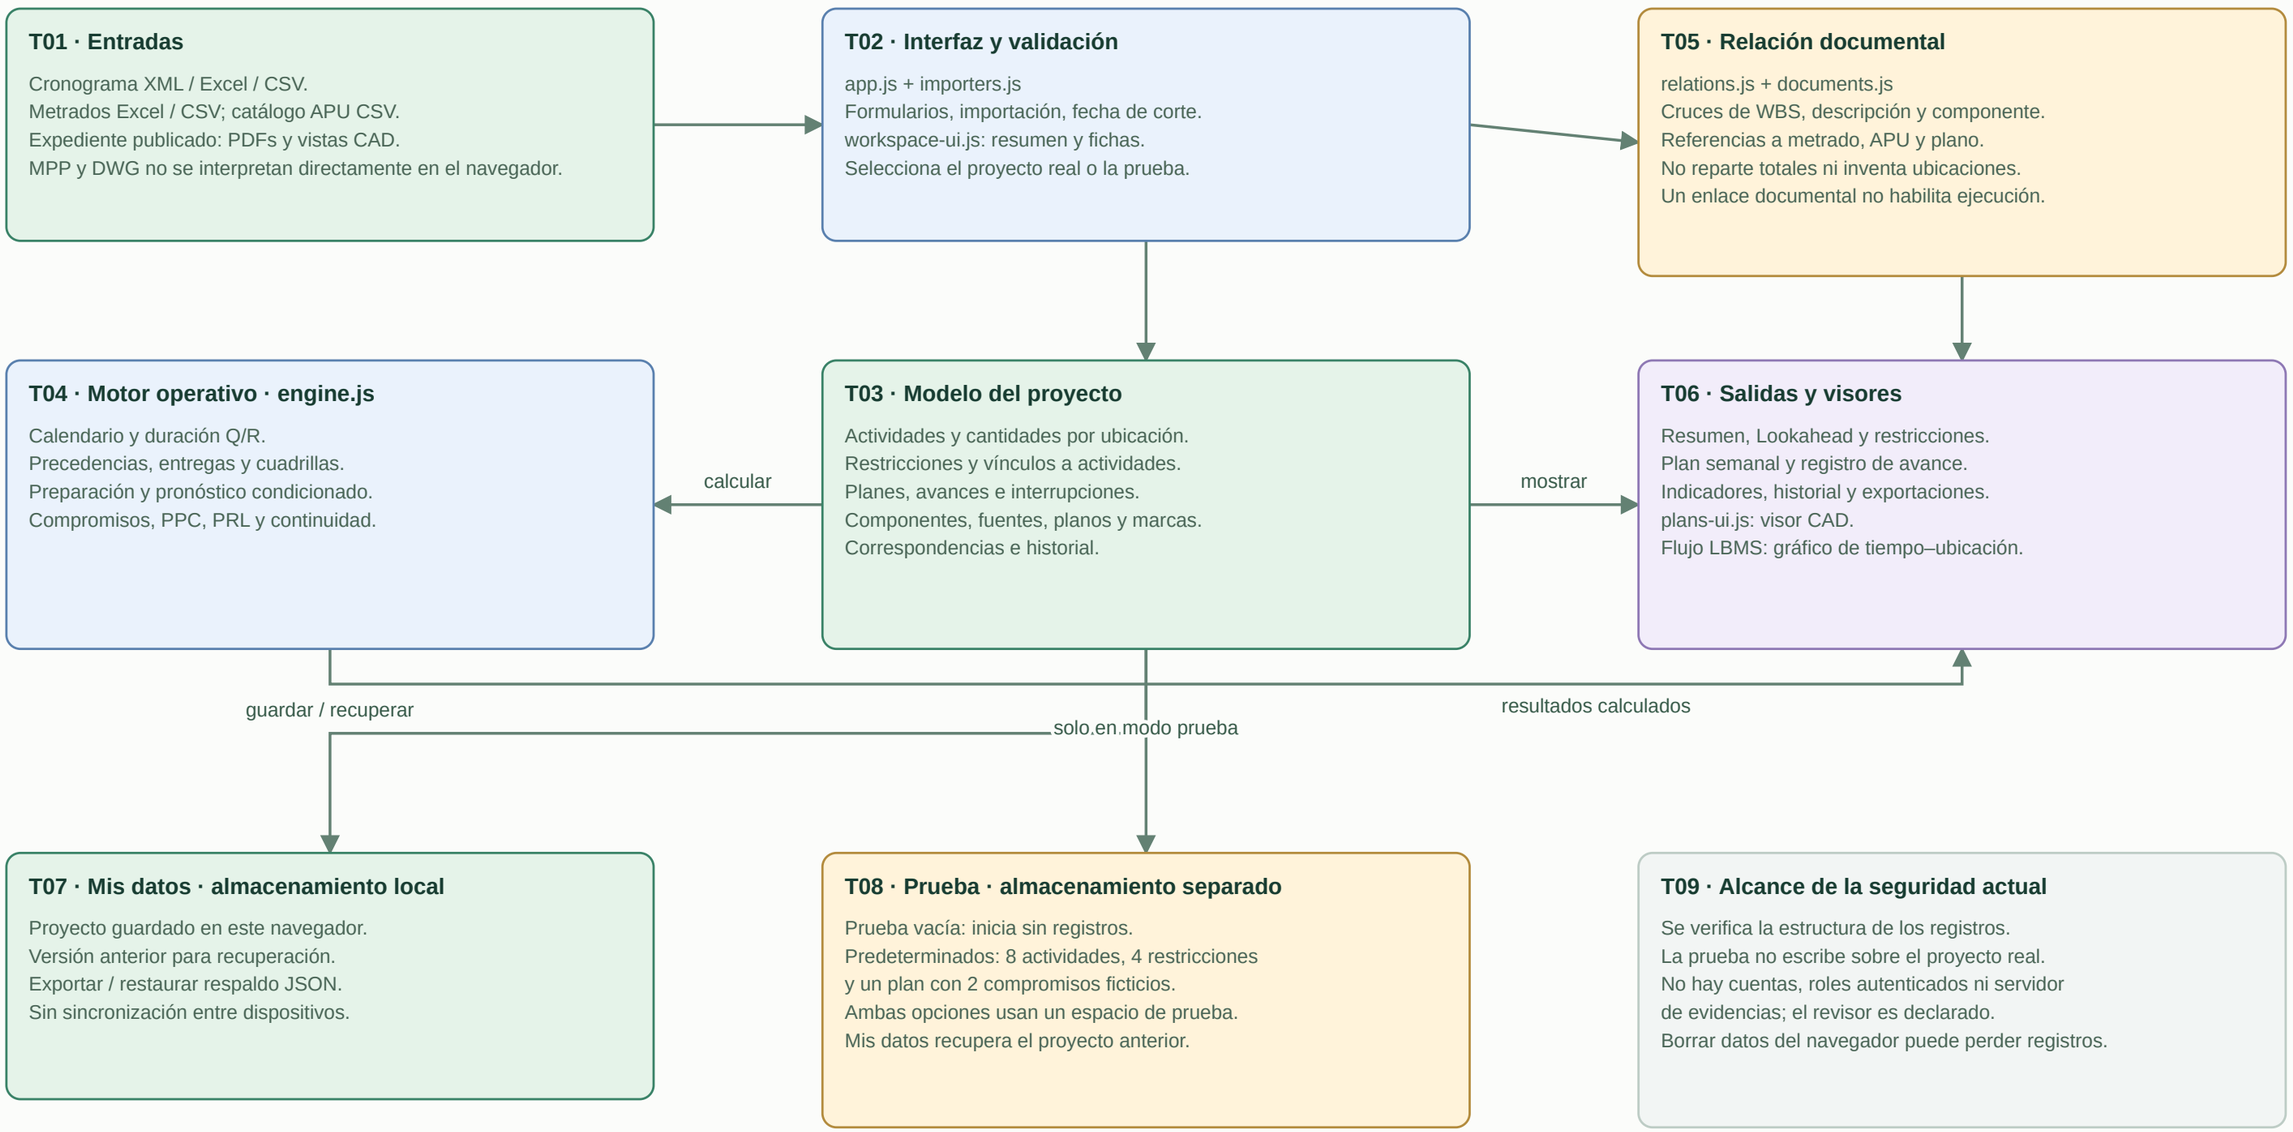

T10 · Qué significa «conectado»

Conexión operativa: misma partida + ubicación → puede alimentar Q/R y preparación si cumple las demás reglas.
Conexión documental: correspondencia de fuentes → sirve para consultar y revisar, aunque la ejecución siga pendiente.
LBS y cuadrillas reales deben definirse y validarse; los documentos agregados no sustituyen esos datos.
